
PRECISE GOT DIGITAL TALENT

PCC AI Transformation Framework

คู่มือเปิดโมเดลสอนทีม และพัฒนาโครงการให้เกิดผลจริง

สำหรับ Group COO • Earth • Mentor • เจ้าของธุรกิจ • ทีม IT/Data

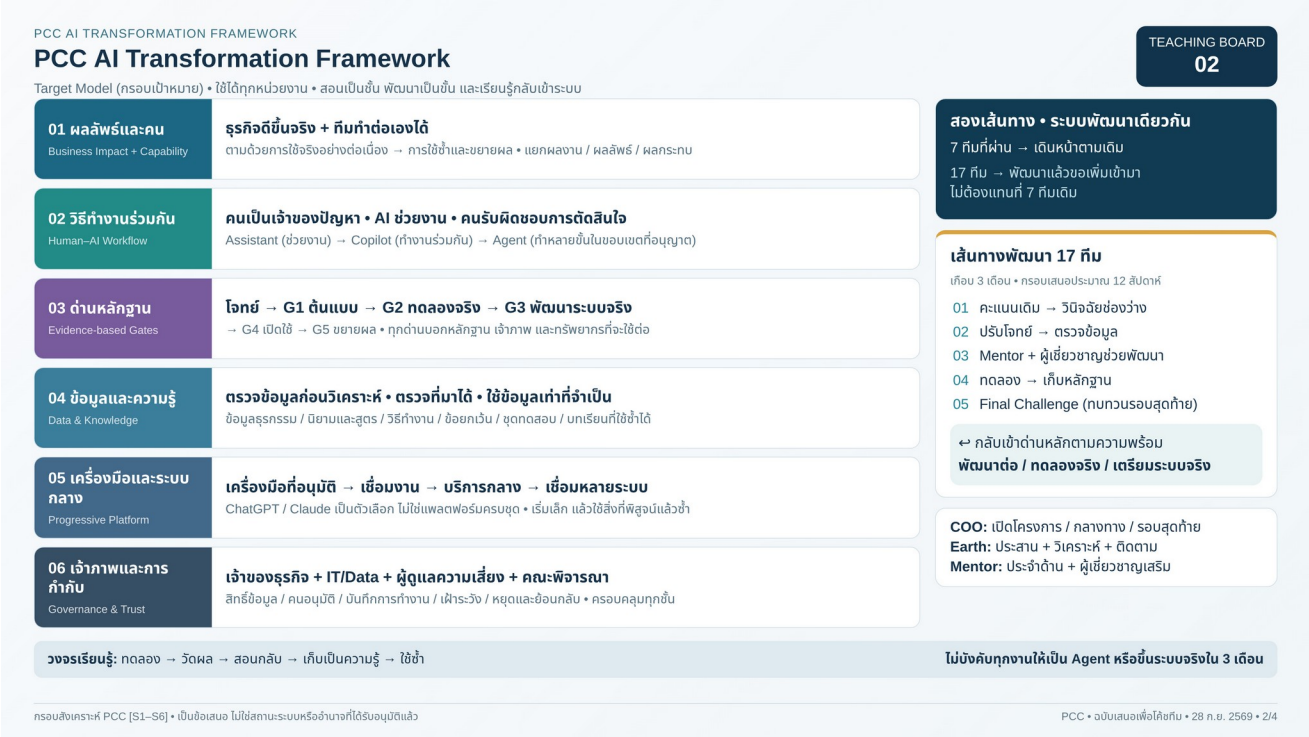

เป้าหมายหลัก: ผลลัพธ์ธุรกิจ + ความสามารถทีม
จากนั้นจึงพิจารณาการใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และการขยายผล

ชุดนี้เป็นกรอบเป้าหมายและข้อเสนอการทำงาน ไม่ใช่คำยืนยันว่าโครงสร้าง ระบบ งบประมาณ หรืออำนาจอนุมัติทั้งหมดมีอยู่แล้ว

ช่วงพัฒนา: เกือบ 3 เดือน ตามข้อมูลผู้ใช้ • ใช้แผนประมาณ 12 สัปดาห์เพื่อจัดจังหวะงาน ไม่ใช่กำหนดวันแข่งขันจริง

อ่านเริ่มต้น: หน้า 2 → 7 → 9 → 19 → 23 | เปิดสอน: ภาพ 01 → 02 → 03 → 04

02 | สถานะล่าสุดและ QC ก่อนใช้กรอบ

ข้อมูลภายในส่วนนี้มาจากคำบอกเล่าและทางเลือกที่ผู้ใช้ให้ในบทสนทนา ยังไม่ได้ตรวจเอกสารประชุม คะแนนรายทีม หรือนโยบายบริษัท

ประเภทข้อมูล	สิ่งที่ใช้เป็นฐานในชุดนี้
ผู้ใช้รายงาน	มีการคัดเลือกแล้ว 7 ทีมผ่าน และ 17 ทีมยังไม่ผ่าน; Group COO ระบุในที่ประชุมให้ 7 ทีมเดินต่อ และพัฒนา 17 ทีมกลับมา Challenge
ทิศทางที่ผู้ใช้เลือก	ทีมที่พร้อมสามารถเพิ่มเข้ากลุ่มที่ไปต่อ โดยไม่ต้องแทนที่ 7 ทีม และเข้าสู่ขั้นถัดไปตามความพร้อม
ข้อมูลที่มีแต่ยังไม่ได้อ่าน	คะแนน เกณฑ์ และคอมเมนต์อยู่กับ Earth; ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าแต่ละทีมไม่ผ่านเพราะอะไร
สิ่งที่ยังไม่ยืนยัน	วันรอบถัดไป รายชื่อ/บทบาททีม รายละเอียด 7 ทีม นโยบายข้อมูล บัญชี ChatGPT/Claude ที่ใช้งานจริง ความพร้อม IT งบและอำนาจอนุมัติ
ข้อเสนอในชุดนี้	6 ชั้นของ PCC, G1–G5, คณะพิจารณาขนาดเล็ก, แบบหลักฐาน, แผน 12 สัปดาห์ และวิธีติดตามของ Earth

ขอบเขตการใช้

ใช้เป็นภาษากลางเพื่อพัฒนาทุกหน่วยงาน โดยมีตัวอย่างเครดิตและลูกหนี้หนึ่งเส้นทาง ไม่สร้างโครงการลูกหนี้ใหม่ทับสองทีมที่ผู้ใช้จำได้คร่าว ๆ และไม่ตัดสินคุณภาพของทีมที่ยังไม่เห็นผลงาน

ลำดับงานที่เสนอ: ตรวจเกณฑ์เดิม → วินิจฉัยช่องว่าง → ทดลองเล็ก → พิสูจน์ → จัดเส้นทางต่อ
ไม่เริ่มจากซื้อแพลตฟอร์ม หรือกำหนดให้ทุกทีมทำ **Agent**

Group COO เป็นบุคคลเดียวกับ Group CEO เดิมตามผู้ใช้เล่า แต่เหตุผลและขอบเขตอำนาจหลังเปลี่ยนตำแหน่งยังไม่ทราบ จึงต้องอ้างอำนาจอนุมัติจริงของบริษัท ไม่อนุมานจากชื่อตำแหน่ง

03 | กรอบอ้างอิง 6 ชุด ไม่ใช่มาตรฐานชนิดเดียวกัน

กรอบ / ประเภท	แก่นของต้นฉบับ	PCC เลือกนำมาใช้
MIT CISR [S1] กรอบวิจัย	ความพร้อม AI ระดับองค์กร 4 ช่วง	พัฒนาคน วิธีทำงาน และองค์ประกอบที่ใช้ซ้ำ
Microsoft HAX [S2, S2a] แนวทางออกแบบ	18 แนวทางครอบคลุมการเริ่มใช้ ระหว่างใช้ เมื่อผิด และเมื่อใช้ต่อเนื่อง	ทำให้คนเข้าใจ ตรวจ และแก้การทำงานของ AI
Stage-Gate® [S3] กรอบจัดการนวัตกรรม	ทำงานในแต่ละช่วง และตัดสินลงทุนต่อที่ด่าน	ใช้หลักฐานกำหนดขั้นต่อไปและทรัพยากร
NIST AI RMF 1.0 [S4] กรอบความเสี่ยงแบบสมัครใจ	Govern ครอบคลุม Map / Measure / Manage	ควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องทุกช่วง
ISO/IEC 42001:2023 [S5] มาตรฐานระบบบริหาร	ระบบบริหาร AI และการปรับปรุงตาม PDCA	นโยบาย เจ้าภาพ การทบทวน และหลักฐาน
OECD AI Principles [S6] หลักการระหว่างประเทศ	หลักคุณค่า 5 ด้าน และข้อแนะนำเชิงนโยบายอีกส่วน	ใช้ 5 หลักคุณค่าเป็นเกณฑ์ความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดการอ้างอิง

ภาพทั้งหกเป็นภาพย่อที่เรียบเรียงใหม่เพื่อการสอน ไม่คัดลอกแผนภาพต้นฉบับทั้งชุด ไม่อ้างว่า PCC ได้รับการรับรอง ISO และไม่อ้างว่าหน่วยงานเจ้าของกรอบรับรองโมเดลสังเคราะห์นี้

ส่วน Assistant → Copilot → Agent, สถาปัตยกรรมหกชั้น, G1–G5 ของ PCC และโปรแกรมพัฒนา 17 ทีม เป็นการออกแบบเพื่อโจทย์นี้ ไม่ใช่ข้อกำหนดของ HAX หรือ MIT

04 | สอนกรอบองค์กร และกรอบคน–AI

MIT CISR: ความพร้อม AI เป็นเรื่ององค์กร [S1]

ช่วงต้นฉบับ	คำอธิบายย่อสำหรับสอน
1 Experiment and Prepare	ทดลอง เรียนรู้ จัดกติกา และเตรียมข้อมูล
2 Build Pilots and Capabilities	ทดลองกับงานและพัฒนาความสามารถที่รองรับ
3 Develop AI Ways of Working	ปรับวิธีทำงาน และออกแบบสิ่งที่นำกลับมาใช้ซ้ำ
4 Become AI Future Ready	ฝัง AI ในการทำงานและสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่

งานวิจัยเผยแพร่ปี 2024 ใช้การสำรวจปี 2022 และสัมภาษณ์เสริมปี 2024 จึงไม่ควรนำตัวเลขความสัมพันธ์ในงานวิจัยมาอ้างว่า AI จะทำให้กำไร PCC เพิ่มตามนั้น หรือใช้ตัดสินความพร้อมของ PCC โดยยังไม่ประเมิน

HAX: ออกแบบให้คนใช้งานได้เมื่อ AI ไม่สมบูรณ์ [S2, S2a]

ช่วงการใช้งาน	สิ่งที่จะให้ทีมสาธิต
เริ่มใช้	หน้าจอบอกว่า AI ช่วยอะไร ไม่ช่วยอะไร และข้อมูลมาจากไหน
ระหว่างใช้	ผู้ใช้เรียกใช้หรือข้ามคำแนะนำได้โดยไม่ขัดจังหวะงาน
เมื่อ AI ผิด	คนแก้ไข ปฏิเสธ หรือกลับไปทำแบบเดิมได้
ใช้ต่อเนื่อง	มีช่องทางเสนอแนะ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และแจ้งผู้ใช้

คำถามสอน: **“ผู้ใช้ต้องเห็นอะไร จึงรู้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อคำตอบนี้?”**
การเพิ่มอำนาจให้ **AI** ต้องตามหลักฐานและความเสี่ยง ไม่ใช่รางวัลของทีมที่ทำเก่งขึ้น

05 | สอนเรื่องด่านลงทุน และความเสี่ยง

Stage-Gate®: Stage เป็นงาน; Gate เป็นการตัดสินใจ [S3]

ต้นฉบับอธิบายการค้นหาโอกาส ตามด้วยแนวคิด เหตุผลการลงทุน การพัฒนา การทดสอบยืนยัน และการนำออกใช้ โดยมีด่านพิจารณาก่อนแต่ละช่วง ทำซ้ำหรือย้อนปรับได้ ไม่จำเป็นต้องเดินเส้นตรง

ในแต่ละด่านต้องแยก	นำมาประยุกต์กับ **PCC**
ข้อมูลที่นำมาพิจารณา	สิ่งที่พิสูจน์แล้ว ข้อจำกัด และแผนทดสอบขั้นต่อไป
เกณฑ์	ความคุ้มค่า ความพร้อม และความเสี่ยงของขั้นที่จะขอทำ
ผลตัดสิน	เดินต่อ / หยุด / พัก / กลับไปปรับ พร้อมคน งบ และวันทบทวน

G1–G5 ในคู่มือนี้ดัดแปลงสำหรับ AI ในงานองค์กร ไม่ใช่ชื่อด่านต้นฉบับ และไม่ทำให้ทุกจุดตรวจของ Mentor ต้องรอ Group COO

NIST AI RMF: Govern ครอบคลุม ไม่ใช่ลูกศรขั้นแรก [S4, S4a]

หน้าที่	ตัวอย่างคำถามประยุกต์
Govern: กำกับดูแล	ใครรับผิดชอบ ใครอนุมัติ และมีหลักฐานอะไรตรวจย้อนกลับได้?
Map: เข้าใจบริบท	ระบบใช้กับใคร ข้อมูลอะไร และใครอาจได้รับผลกระทบ?
Measure: ประเมิน	ทดสอบข้อผิดพลาดอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่าผลยังน่าเชื่อถือ?
Manage: จัดการ	ลดความเสี่ยงอย่างไร ใครหยุดระบบ และกลับไปทำงานเดิมได้หรือไม่?

ใช้ AI RMF 1.0 (2023) เป็นฐาน เอกสารทางการระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุง ณ วันที่ตรวจ 28 ก.ย. 2569 การใช้งานจริงควรบันทึกเวอร์ชันที่อ้างอิง ไม่อ้างว่าเป็นใบรับรอง [S4a]

06 | สอนเรื่องระบบบริหาร และความรับผิดชอบ

ISO/IEC 42001:2023: ระบบบริหารที่ทำต่อได้ [S5]

ใช้ข้อมูลสรุปสาธารณะของ ISO เท่านั้น ไม่ได้ตรวจข้อกำหนดฉบับเต็มทุกข้อ หลักที่หยิบใช้คือการจัดระบบบริหาร AI และปรับปรุงต่อเนื่องด้วย Plan–Do–Check–Act (วางแผน–ดำเนินการ–ตรวจ–ปรับปรุง)

วงจร	ตัวอย่างที่เสนอให้ **PCC** ทำ
วางแผน	กำหนดวัตถุประสงค์ เจ้าภาพ ขอบเขต และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ดำเนินการ	ทดลองตามขอบเขตที่อนุมัติและเก็บร่องรอย
ตรวจ	ตรวจผลจริง เหตุผิดพลาด ต้นทุน และเสียงผู้ใช้
ปรับปรุง	แก้กระบวนการ ความรู้ กฎ และสิทธิ์ให้เหมาะกับผลที่พบ

OECD: ใช้หลักคุณค่า 5 ด้าน [S6]

หลักคุณค่า (สรุปไทย)	คำถามประยุกต์
ประโยชน์ทั่วถึง ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดี	ใครได้ประโยชน์ และใครต้องรับภาระเพิ่ม?
สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ความเป็นส่วนตัว	สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองหรือไม่?
โปร่งใสและอธิบายได้	คนรู้หรือไม่ว่า AI มีบทบาทตรงไหน และทักท้วงได้อย่างไร?
เชื่อถือได้ มั่นคงปลอดภัย ไม่ก่ออันตราย	ระบบยังปลอดภัยเมื่อข้อมูลไม่ครบหรือเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่?
มีผู้รับผิดชอบ	ใครรับผิดชอบผล และใครตรวจสอบการกระทำได้?

การมีคู่มือหรือภาพโมเดล ไม่เท่ากับผ่านมาตรฐาน และไม่แทนการตรวจข้อกฎหมายหรือนโยบายจริง

07 | วิธีอ่าน PCC Target Model เป็น 6 ชั้น

เริ่มสอนจากผลลัพธ์ด้านบน แล้วถามย้อนลงมาว่าระบบข้างใต้รองรับหรือไม่ จากนั้นใช้ด่านพัฒนาเป็นเส้นทางทำงาน และใช้บทเรียนเป็นวงจรกลับขึ้นไปปรับปรุง

ชั้น	สิ่งที่ทีมต้องออกแบบ	คำถามที่เปิดสอน
1 ผลลัพธ์และคน	ผลทางธุรกิจที่เปลี่ยน และความสามารถทีมที่พิสูจน์ได้	เมื่อจบงาน อะไรดีขึ้น และใครทำเองได้?
2 งานร่วมกับ AI	ขั้นตอนเดิม/ใหม่ ผู้ใช้ การตัดสินใจ และกรณียกเว้น	ขั้นตอนไหนควรเปลี่ยน ไม่ใช่แค่เพิ่มแชต?
3 ด่านหลักฐาน	ทดสอบอะไรในแต่ละช่วง และขออนุมัติอะไรต่อ	หลักฐานชิ้นไหนพอให้ใช้ทรัพยากรเพิ่ม?
4 ข้อมูลและความรู้	ข้อมูลที่ตรวจแล้ว นิยาม สูตร และบทเรียน	ข้อมูลนี้เชื่อได้แค่ไหน และใครยืนยัน?
5 เครื่องมือและแพลตฟอร์ม	เครื่องมือที่อนุมัติ การเชื่อมงาน และส่วนที่ใช้ซ้ำ	ใช้ของเดิมได้แค่ไหน ก่อนสร้างใหม่?
6 เจ้าภาพและการกำกับ	เจ้าของธุรกิจ สิทธิ์ ความเสี่ยง การติดตาม และย้อนกลับ	ใครมีอำนาจทำอะไร และถ้าผิดจะหยุดอย่างไร?

กลไกเชื่อมการทำกับผล

ปรับกระบวนการที่เป็นคอขวด → ใช้ข้อมูลที่ตรวจแล้วให้คน/AI ทำงานเฉพาะส่วน → ลดงานซ้ำหรือข้อผิดพลาด → ผู้ใช้ยอมใช้ → จึงคาดหวังผลธุรกิจ โดยต้องทดสอบแต่ละลูกศร ไม่ถือว่าต้นแบบสำเร็จแล้วผลกระทบเกิดเอง

ไม่ควรทำ

ไม่เร่งสร้างแพลตฟอร์มกลางขนาดใหญ่ ไม่บังคับทุกทีมใช้เทคโนโลยีเดียวกัน และไม่ให้คะแนนสูงเพียงเพราะใช้ Agent หรือเชื่อมหลายระบบได้

08 | แบ่งงานคน–AI และค่อยเพิ่มความสามารถ

รูปแบบที่เสนอ	**AI** ทำอะไรได้	คน/ระบบควบคุม
Assistant (ผู้ช่วย)	ค้น สรุป ร่าง และช่วยอธิบายจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต	คนตรวจทุกผลก่อนนำไปใช้นอกทีม
Copilot (ผู้ร่วมงาน)	เสนอคิว ทางเลือก ข้อผิดพลาด หรือร่างการกระทำ	คนยืนยันข้อมูลและอนุมัติการกระทำที่มีผลต่อผู้อื่น
Agent (ทำงานหลายขั้น)	ทำเฉพาะงานและเครื่องมือที่อนุญาตภายในขอบเขตที่ทดสอบแล้ว	จำกัดสิทธิ์ บันทึกเหตุการณ์ หยุด/ย้อนกลับได้ และให้คนอนุมัติจุดสำคัญ

สามรูปแบบนี้เป็นภาษาทำงานของ PCC ไม่ใช่ระดับความพร้อมตามมาตรฐาน งานเสี่ยงสูงอาจเหมาะกับ Copilot ตลอดไป แม้ทีมมีทักษะสูงขึ้น

แยกระบบอัตโนมัติทั่วไปออกจาก AI

สูตรคำนวณ กฎอนุมัติ และการจัดลำดับขั้นที่ตายตัว ควรใช้ระบบที่ตรวจซ้ำได้; AI ภาษาใช้กับข้อมูลที่ต้องอ่าน สรุป หรือร่าง ส่วนการพยากรณ์ต้องใช้แบบจำลองและผลทดสอบ ไม่ใช้ความมั่นใจของแชตเป็นคะแนนความเสี่ยง

เส้นทางแพลตฟอร์มที่เสนอ

เริ่มก่อน	ต่อเมื่อมีหลักฐาน
เครื่องมือที่บริษัทอนุมัติ + คลังวิธีใช้	เชื่อมข้อมูลและขั้นตอนงานที่ทดลองแล้วว่าช่วยจริง
ส่วนเชื่อมและชิ้นงานที่ทีมใช้ร่วมกัน	รวมสิทธิ์ คลังความรู้ ชุดทดสอบ และการเฝ้าระวัง
บริการกลางที่มีเจ้าภาพและต้นทุนชัด	เชื่อมหลายหน่วยงานเมื่อความพร้อมและคุณค่ารองรับ

คำว่า “ChatGPT for Work” ยังไม่ยืนยันว่า PCC ใช้แพ็กเกจใด OpenAI มีเงื่อนไขเฉพาะผลิตภัณฑ์องค์กร [S7] แต่เงื่อนไขผู้ให้บริการไม่แทนนโยบาย PCC; ตรวจบัญชี สิทธิ์ และข้อมูลที่อนุญาตก่อนใช้จริง เช่นเดียวกับ Claude และเครื่องมืออื่น

09 | G1–G5: อนุมัติอะไร และห้ามข้ามอะไร

ด่าน	การอนุมัติ / หลักฐานขั้นต่ำ	ก่อนผ่านต้องไม่มี
G1 ทำต้นแบบ	โจทย์และเจ้าของธุรกิจ; ค่าฐานเบื้องต้น; ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ได้; ทางเลือกไม่ใช้ AI; สมมติฐานที่จะทดสอบ	ข้อมูลไม่ทราบสิทธิ์ หรือปัญหาที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
G2 ทดลองหน้างาน	ผลทดสอบต้นแบบ; ผู้ใช้และขอบเขต; คนกำกับ; เกณฑ์หยุด; การตรวจข้อมูล/ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	การส่งออกข้อมูล/กระทำต่อลูกค้าโดยยังไม่อนุญาต
G3 พัฒนาระบบจริง	ผลทดลองพร้อมตัวเทียบและข้อจำกัด; ผู้ใช้ยืนยัน; ทักษะทีม; ต้นทุน; IT/Data ตรวจความเป็นไปได้; แผนปิดความเสี่ยง	ผลดีที่ตรวจย้อนกลับไม่ได้ หรือไม่มีผู้รับช่วงเทคนิค
G4 เปิดใช้จริง	ทดสอบรับมอบ; สิทธิ์และความปลอดภัย; ผู้ดูแล; คู่มือ; ต้นทุน; การเฝ้าระวัง; วิธีหยุด/ย้อนกลับ	ความเสี่ยงวิกฤตค้าง หรือยังไม่มีผู้รับผิดชอบการใช้งาน
G5 ขยายผล	ผลต่อเนื่อง; ต้นทุนขยาย; ชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำ; เจ้าภาพหน่วยงานใหม่; ทดสอบบริบทปลายทาง	การเหมารวมว่าทำได้ในทีมแรกแล้วใช้ได้ทุกที่

คณะพิจารณาร่วมกับผู้มีอำนาจตามเรื่องเป็นผู้ตัดสิน ไม่ให้คะแนนด้านธุรกิจชดเชยการไม่ผ่านเรื่องสิทธิ์ข้อมูล ความปลอดภัย หรือการควบคุมที่จำเป็น

ผ่าน **Final Challenge** ≠ ผ่าน **G4** อัตโนมัติ
ให้ระบุว่าทีมพร้อมทำต้นแบบ ทดลองจริง พัฒนาระบบจริง หรือควรกลับไปปรับโจทย์

ช่วงเกือบ 3 เดือนให้มุ่งหลักฐานสำหรับด่านที่เหมาะกับแต่ละทีม ไม่บังคับทุกทีมเดินครบ G1–G5

10 | บทบาทและอำนาจที่ต้องตกลงก่อนเริ่ม

บทบาทที่เสนอ	รับผิดชอบหลัก	ไม่ควรรับแทนผู้อื่น
Group COO	สอนกรอบ สนับสนุนข้ามหน่วยงาน และร่วมพิจารณาจุดเปิดโครงการ/กลางทาง/รอบสุดท้าย	ไม่ต้องเป็นผู้แก้ปัญหารายวันของ 17 ทีม
คณะพิจารณาขนาดเล็ก	COO + เจ้าของธุรกิจ + IT/Data และ Finance/Risk ตามเรื่อง; ตัดสินด่านและทรัพยากรภายในอำนาจ	ไม่แทนผู้มีอำนาจตามระเบียบบริษัท; ต้องยืนยันการแต่งตั้ง
Business Owner เจ้าของผลธุรกิจ	รับรองปัญหา เปิดให้ผู้ใช้ทดลอง ยืนยันผล และรับผิดชอบการนำไปใช้ต่อ	ไม่ส่งงานให้ IT แล้วจบความรับผิดชอบ
Earth Coordinator + Analyst + PMO	จัดข้อมูลคะแนน/ความเห็น วินิจฉัยเบื้องต้นกับ Mentor ประสานงาน ติดตามหลักฐาน/การตัดสินใจ	ไม่อนุมัติผ่านด่าน ไม่รับรองบัญชี/เทคนิค ไม่เป็น Mentor ทุกเรื่อง
Domain Mentor + Specialist	Mentor หลักเข้าใจธุรกิจ; ดึงผู้เชี่ยวชาญ Process/Data/AI/Change/Risk ตามช่องว่าง	ไม่สร้างผลงานแทนทีมจนทีมอธิบายและทำซ้ำไม่ได้
Team Lead + สมาชิก	สร้างต้นแบบ ทดสอบ เก็บหลักฐาน และอธิบายสิ่งที่เรียนรู้	ไม่อนุมัติใช้ข้อมูลหรือขึ้นระบบจริงด้วยตนเอง
IT/Data + ผู้ดูแลความเสี่ยง	ช่วยวางขอบเขตปลอดภัยตั้งแต่ต้น รับช่วงวิศวกรรมระบบจริงและการดูแลตามหน้าที่	ไม่รับระบบขึ้นใช้งานโดยยังไม่มี Business Owner

สิทธิ์เข้าถึงคะแนน/ความเห็นต้องตามอำนาจและวัตถุประสงค์ ประสานให้ Earth แจกเฉพาะข้อมูลที่แต่ละบทบาทจำเป็นต้องรู้ ไม่เปิดคะแนนละเอียดของทุกทีมให้ทุกคนโดยอัตโนมัติ

11 | วิธีที่ Group COO เปิดสอนด้วย 4 ภาพ

ข้อเสนอการเปิดสอนครั้งแรก: เริ่มด้วยภาพอ้างอิงเพื่อให้เห็นฐานคิด ใช้ภาพ PCC เป็นกระดานหลัก แล้วเลือกตัวอย่างและคำถามตามเวลาจริง

ภาพ	เรื่องที่ใช้สอน	คำถามเปิดวง
01 • 6 Reference Models	กรอบองค์กร การทำงานคน–AI การลงทุนทีละขั้น และความรับผิดชอบ	กรอบไหนช่วยอธิบายจุดที่ทีมเรายังไม่ชัด?
02 • PCC Target Model	ไล่จากผลธุรกิจลงมาถึงสิทธิ์และเจ้าภาพ แล้วเชื่อมเส้นทาง 17 ทีม	ชั้นไหนเป็นข้อจำกัดจริงของทีมตอนนี้?
03 • Credit & Collection	แยกสาเหตุหนี้ค้าง เลือกเทคโนโลยี และเห็นทางจากต้นแบบถึงขยายผล	จุดไหนใช้กฎเดิมก็พอ จุดไหน AI เพิ่มคุณค่า?
04 • Coaching & Gates	เลือกคำถามและหลักฐานของด่านที่จะขอผ่าน ไม่ถามทุกข้อทุกครั้ง	หลักฐานชิ้นใดที่จะทำให้เราเปลี่ยนใจ?

รูปแบบการโค้ชรายทีมที่เสนอ

ทีมอธิบายงานเดิมและปัญหาจากหลักฐาน → COO/Mentor ถามเพื่อเข้าใจ → ทดสอบสมมติฐานสำคัญ → สรุปการทดลองเล็กครั้งถัดไป โดยปิดวงด้วยเจ้าภาพ หลักฐานที่ต้องได้ และวันกลับมาทบทวน

ประโยคสอนที่ใช้ได้ทันที

> “เราไม่ได้พัฒนาทีมให้ชนะด้วยเดโมที่สวยกว่า แต่ให้พิสูจน์ว่างานดีขึ้นและทีมทำต่อเองได้
> ทีมที่พบว่า **AI** ไม่คุ้ม แล้วหยุดด้วยหลักฐาน ก็สร้างความรู้ที่มีค่าต่อองค์กร”

เวลาคุยที่เสนอเป็นการจัดรูปแบบ ไม่ใช่ตารางนัดหมายจริง ให้ Earth ปรับตามเวลาที่ได้รับจาก Group COO

12 | คำถามโค้ช: เข้าใจโจทย์และวิธีทำงาน

เรื่อง	**Teach:** พาให้คิด	**Challenge:** ทดสอบสมมติฐาน
เป้าหมาย	ใครต้องการผลนี้ และตัวชี้วัดเดิมคืออะไร?	ตัวเลขที่ดีขึ้นสะท้อนปัญหาจริงหรือเพียงวัดสิ่งที่ทำง่าย?
ปัญหาจริง	งานเริ่มและจบตรงไหน ใครรอใคร?	ปัญหานี้เกิดจากข้อมูล กติกา เจ้าภาพ หรือทักษะมากกว่าเทคโนโลยีหรือไม่?
ทางเลือก	ปัจจุบันแก้อย่างไร และจุดไหนยังเสียเวลา?	หากไม่ใช้ AI ใช้การปรับขั้นตอนหรือกฎธรรมดาแก้ได้เท่าไร?
ข้อมูล	ตัวเลขและเอกสารมาจากไหน ใช้วันตัดยอดอะไร?	ตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนของงานจริงหรือเลือกเฉพาะเคสง่าย?
คนกับ AI	ใครตรวจผล และใครตัดสินใจขั้นสุดท้าย?	เมื่อ AI ให้คำตอบที่น่าเชื่อแต่ผิด ใครจะจับได้ และทันหรือไม่?
เครื่องมือ	ใช้เครื่องมือเดิมและสิทธิ์เดิมได้แค่ไหน?	จำเป็นต้องเชื่อมทุกระบบตั้งแต่ต้น หรือทดลองแบบเล็กกว่านี้ได้?

คำถามแกนกลางที่ทุกทีมต้องตอบ

“หลักฐานอะไรจะทำให้เรารู้ว่าเราคิดผิด**?”**
ตัวอย่าง**:** ผู้ใช้ตรวจและแก้ **AI** จนใช้เวลามากกว่าวิธีเดิม หรือกฎง่าย ๆ ให้ผลเท่ากันด้วยต้นทุนต่ำกว่า

ใช้ข้อสงสัยเพื่อเลือกการทดลอง ไม่ใช่เพิ่มรายการงานทุกข้อพร้อมกัน Mentor ควรช่วยทีมเลือกความไม่แน่นอนที่มีโอกาสเปลี่ยนคำแนะนำมากที่สุด

13 | คำถามโค้ช: คุณค่า ทักษะ และสัญญาณเตือน

เรื่อง	**Business Case:** พิสูจน์คุณค่า	**Red Flag:** สิ่งที่ต้องหยุดตรวจ
ผลธุรกิจ	ดีขึ้นเท่าไร เทียบอะไร และรวมต้นทุนอะไรแล้ว?	มีตัวเลขประโยชน์ แต่ไม่มีค่าฐาน/สูตร/ช่วงเวลา/หลักฐาน
ผลจาก AI	ผลดีต่างจากการปรับขั้นตอนอย่างเดียวหรือไม่?	เครดิตผลทั้งหมดให้ AI ทั้งที่ทีมเพิ่มคนหรือเปลี่ยนนโยบายพร้อมกัน
ผู้ใช้	ผู้ใช้ทำงานจริงได้ดีขึ้น หรือใช้เพราะต้องโชว์?	มีเดโมแต่ไม่มีผู้ใช้จริง หรือไม่นับงานแก้คำตอบผิด
ความสามารถ	สมาชิกอีกคนทำซ้ำ ตรวจข้อผิดพลาด และอธิบายได้หรือไม่?	มีเพียงหัวหน้าทีมหรือ Mentor ที่ใช้งานและเข้าใจ
ความเสี่ยง	ใครมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลและหยุดการทำงาน?	ใช้บัญชีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ ส่งข้อมูลเกินจำเป็น หรือเปลี่ยนวงเงินเอง
การทำต่อ	มีผู้รับช่วง งบดูแล และวิธีย้อนกลับหรือยัง?	ผ่านรอบนำเสนอแล้ว แต่ไม่มีเจ้าของธุรกิจหรือผู้ดูแลระบบ

ไม่ใช้คำถามท้าทายเป็นการตัดสินคน

ให้แยก “หลักฐานยังไม่พอ” ออกจาก “ทีมไม่มีความสามารถ” และให้โอกาสทีมแสดงสิ่งที่ปรับหลังได้รับคำแนะนำ โดยเก็บเหตุผลการตัดสินใจทุกครั้ง

คำถามปิดวง: **“ก้าวเล็กที่สุดที่เราจะทำก่อนรอบหน้า คืออะไร และผลแบบไหนทำให้เดินต่อ ปรับ หรือหยุด?”**

14 | Scorecard: เทียบเป็นธรรม โดยยังไม่ล็อกน้ำหนัก

ใช้เกณฑ์เดิมเป็นฐานก่อนเพิ่มเรื่องผลธุรกิจ ความสามารถทีม และหลักฐาน ต้องเห็น rubric (เกณฑ์ประเมิน) จาก Earth จึงจะกำหนดน้ำหนักใหม่ ไม่ตั้งตัวเลขให้เหมือนเป็นมติแล้ว

ทางเลือกที่เสนอ	ประโยชน์ / สิ่งที่ต้องยอมแลก
A • โปรไฟล์หลักฐานรายด้าน	ประเมินว่า ยังไม่มี / เริ่มมี / ผ่านการตรวจ / ใช้จริงได้ โดยแยกแต่ละด้าน; เข้าใจง่าย แต่ไม่ให้ลำดับผู้ชนะรวม
B • คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก	ใช้เปรียบเทียบเมื่อเกณฑ์และน้ำหนักประกาศแล้ว; ตัดสินสะดวก แต่คะแนนรวมอาจซ่อนจุดเสี่ยง จึงต้องมีเงื่อนไขห้ามผ่านแยกต่างหาก
C • จัดเส้นทางตามความพร้อม	จัดไปปรับโจทย์ สร้างต้นแบบ ทดลองจริง หรือเตรียมระบบจริง; เหมาะกับการรับทีมเพิ่ม แต่ไม่ใช่การจัดอันดับความเก่ง

เอนเอียง A + C ในระยะแรก และพิจารณา B หลังเทียบเกณฑ์เดิมและได้รับอนุมัติ ไม่ใช้จำนวนข้อมูลที่มากกว่าหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าแทนคุณค่าทางธุรกิจ

เกณฑ์กลางทุกทีม	ตัวอย่างเกณฑ์เฉพาะด้าน
ผลธุรกิจ + ความสามารถทีม เป็นแกนหลัก	Finance: กระทบยอดและนิยามเงินถูกต้อง
การใช้จริง ตามด้วยความพร้อมขยายผล	Sales: ความถูกต้องและผลต่อความสัมพันธ์ลูกค้า
คุณภาพโจทย์ วิธีทดลอง และหลักฐานประกอบทุกด้าน	HR: สิทธิ์ข้อมูล ความเป็นธรรม และผลต่อพนักงาน
ความเสี่ยง/สิทธิ์เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ ไม่ใช่คะแนนชดเชย	Engineering/Operations: การทดสอบทางเทคนิคและความปลอดภัยตามหน้าที่

เสนอให้ประกาศเกณฑ์ก่อนรอบ Challenge ใช้ช่วงหลักฐานและนิยามเดียวกัน บันทึกทรัพยากร/การช่วยเหลือที่ต่างกัน เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนของ Mentor และมีผู้ประเมินอิสระร่วมกรณีสำคัญ

15 | ลูกหนี้: วินิจฉัยสาเหตุ ก่อนสร้างคะแนน AI

นี่เป็นตัวอย่างสาธิต ไม่ใช่ข้อค้นพบจากข้อมูล PCC ควรให้ทีมเดิมที่ทำเรื่องลูกหนี้เทียบกับกรอบนี้ก่อน ไม่ถือว่าทีมต้องเปลี่ยนโครงการทั้งหมด

คำอธิบายที่เป็นไปได้	หลักฐานที่ต้องตรวจ	แนวทางแรกที่อาจไม่ต้องใช้ **AI**
เอกสาร/การวางบิล	หลักฐานส่งมอบ ใบรับงาน วันที่วางบิล วันที่รับเอกสาร	แก้เอกสารและเส้นทางอนุมัติ
ข้อพิพาท/เงินประกัน	เงื่อนไขสัญญา ใบลดหนี้ การรับรองงาน/งวด	แยกประเภทและผู้รับผิดชอบแก้ข้อพิพาท
การติดตามไม่ต่อเนื่อง	ประวัติติดต่อ คำมั่นชำระ ผู้รับผิดชอบ งานตกหล่น	จัดคิวติดตามและเตือนงานตามกฎ
สภาพคล่อง/เครดิตลูกค้า	พฤติกรรมชำระและข้อมูลที่ตรวจได้ในขอบเขตสิทธิ์	ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขตามข้อมูล

QC ข้อมูลขั้นต่ำก่อนวิเคราะห์

เชื่อมรหัสบริษัท–ลูกค้า–ใบแจ้งหนี้–การรับชำระ; ตรวจรายการซ้ำ/ขาด; กระทบยอดกับบัญชี ณ วันตัดยอดเดียวกัน; รองรับชำระบางส่วน ใบลดหนี้ เงินรับล่วงหน้า สกุลเงินและภาษีด้วยนิยามเดียวกัน

แยกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนด รายการมีข้อพิพาท เงินประกันผลงาน และรายการผิดพลาดทางเอกสารออกจากความเสี่ยงเครดิต อย่าใช้ “ค้างเกินกำหนด” แทน “หนี้เสีย” หรือ “เจตนาไม่จ่าย” โดยอัตโนมัติ

เริ่มทดสอบในกลุ่มลูกค้า/หน่วยงานที่กำหนดชัด และไม่ดึงข้อมูลจริงเข้าสู่เครื่องมือที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ หากยังไม่พร้อมให้ใช้ข้อมูลจำลองที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำลอง

16 | ลูกหนี้: ระบบเป้าหมายที่แยกหน้าที่ชัด

ส่วนประกอบ	งานที่เสนอให้ทำ	ขอบเขตควบคุม
กฎและการคำนวณ	คำนวณยอดคงเหลือ วันเกินกำหนด และจัดคิวจากกฎพื้นฐาน	ใช้สูตร/โค้ดที่ตรวจซ้ำได้ กระทบยอด และบันทึกเวอร์ชัน
AI ภาษา	สรุปประวัติ ระบุเอกสารที่ขาด ร่างข้อความติดตามจากข้อมูลที่อนุญาต	แสดงที่มา ไม่สร้างยอดหรือกล่าวหาลูกค้า คนตรวจร่างก่อนส่ง
แบบจำลองพยากรณ์ (ทางเลือก)	ทดสอบการเตือนลูกค้าที่อาจชำระช้า เมื่อข้อมูลและเหตุการณ์พอ	เทียบกฎพื้นฐาน บันทึกผลเตือนผิด/พลาด และไม่ให้ตัดสินเครดิตเอง
คิวงานและผู้รับผิดชอบ	คนยืนยันเหตุและเลือกการกระทำ ระบบบันทึกงาน/นัดหมาย	การส่งจริงหรือเปลี่ยนเงื่อนไขต้องตามสิทธิ์อนุมัติ
บันทึกผลและเรียนรู้	บันทึกคำตอบผิด การแก้ไข ผลติดต่อ และรับชำระที่ตรวจได้	ใช้ผลปรับกฎ/คู่มือ/ชุดทดสอบ; การฝึกโมเดลใหม่ไม่เกิดอัตโนมัติ

เริ่มก่อน

เสนอเริ่มจากคิวติดตามตามกฎ + AI ช่วยสรุป/ร่าง + คนตรวจ เพราะทดสอบขั้นตอนงานได้โดยยังไม่ต้องสร้างคะแนนความเสี่ยงที่อาศัยข้อมูลมาก ไม่สรุปว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจนกว่าเห็นปัญหาและข้อมูลจริง

ยังไม่ทำในต้นแบบ

ไม่ตัดวงเงินอัตโนมัติ ไม่บล็อกส่งสินค้า ไม่ตัดหนี้สูญ ไม่ส่งข้อความหรือดำเนินการทางกฎหมายเอง และไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างคะแนน

หมายเหตุ: ในอนาคตอาจพิจารณาร่วมกับธนาคาร Fintech หรือผู้ให้เทคโนโลยี แต่ไม่ได้สมมติว่ามีพันธมิตร บริการ API หรือเงื่อนไขรับความเสี่ยงรองรับแล้ว

17 | ลูกหนี้: วิธีทดสอบและนิยามผลลัพธ์

พิสูจน์ว่าดีขึ้น ไม่ใช่เพียงดูดี

กำหนดกลุ่มงาน วันตัดยอด สูตร และช่วงติดตามก่อนทดลอง ใช้กฎพื้นฐาน/วิธีเดิมเป็นตัวเทียบ หากเหมาะสมให้เทียบกลุ่มลูกค้าที่ใกล้กันในช่วงเดียวกัน หรือทยอยเปิดใช้พร้อมบันทึกความต่าง ไม่แบ่งใบแจ้งหนี้ลูกค้าคนเดียวให้สองวิธีจนผลปะปน

ถ้าทดสอบแบบจำลอง ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่จะตัดสินใจจริง แยกช่วงเวลาเรียนรู้กับทดสอบ และไม่เอาข้อมูลการรับเงินหลังวันนั้นไปเป็นตัวแปรพยากรณ์ ตรวจทั้งการเตือนผิดและการพลาดลูกค้าที่ควรติดตาม

ตัวชี้วัดที่เสนอ	นิยาม / ข้อจำกัด
เวลาทำงานสุทธิ	เทียบเวลาต่องานที่เสร็จ รวมตรวจ แก้ข้อผิดพลาด และงานดูแล ไม่เทียบเฉพาะเวลาสร้างคำตอบ
ยอดค้างเกินกำหนด ณ วันตัดยอด	ยอดคงเหลือของรายการที่เกินกำหนด; รายงานข้อพิพาท/เงินประกันแยก และใช้ประชากรเทียบคงที่
ชำระตรงเวลา	ระบุชัดวัดตามจำนวนใบหรือมูลค่า และปฏิบัติต่อชำระบางส่วนอย่างไร
DSO (วันเก็บหนี้เฉลี่ย)	นิยามตัวอย่าง: ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย ÷ ยอดขายเชื่อในงวด × จำนวนวันในงวด; Finance ต้องยืนยันรายการและฐานภาษีให้ตรงกัน
ผลหนี้เสีย	ต้องมีนิยามบัญชีและช่วงติดตามพอ ไม่อ้างลดหนี้เสียจากเดโมหรือทดลองสั้น
ความสามารถทีม	สมาชิกทำซ้ำกับเคสใหม่ ตรวจข้อผิดพลาด และอธิบายผล/ข้อจำกัดได้โดยไม่ให้ Mentor ทำแทน

หนี้ที่เก็บเร็วขึ้นไม่ใช่รายได้ใหม่ และเวลาที่ลดลงไม่ใช่เงินสดที่ประหยัดได้ทันที
ผลก่อน–หลังอย่างเดียวเป็นหลักฐานแนวโน้ม ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่า **AI** เป็นสาเหตุ

18 | ลูกหนี้: เดินครบเส้นทางโดยไม่เร่งข้ามด่าน

ช่วง	สิ่งที่ทำ / หลักฐาน	ผลเมื่อผ่านด่าน
โจทย์และข้อมูล	เลือกปัญหาที่มีเจ้าภาพ แยกสาเหตุค้าง และตรวจสิทธิ์/ยอดข้อมูล	G1: ให้ทำต้นแบบในขอบเขตจำกัด
ต้นแบบ	กฎพื้นฐาน + AI สรุป; ใช้เคสทดสอบและสถานการณ์ผิดพลาด; ยังไม่ส่งจริง	G2: ให้ลองในงานจริงโดยมีคนกำกับ
ทดลองหน้างาน	ผู้ใช้จริง กลุ่มลูกค้าที่อนุมัติ เทียบวิธีเดิม บันทึกเวลา/ข้อผิดพลาด/ผลติดต่อ	G3: อนุมัติทรัพยากรพัฒนาระบบจริงเมื่อผลและความเสี่ยงรองรับ
พัฒนาระบบจริง	IT/Data ดูแลการเชื่อมระบบ สิทธิ์ ทดสอบ บันทึกเหตุการณ์และแผนย้อนกลับ	G4: เปิดใช้งานเมื่อรับมอบและมีผู้ดูแล
ใช้งานจริง	ติดตามคุณภาพข้อมูล ผลธุรกิจ ต้นทุน และเหตุผิดพลาดต่อเนื่อง	G5: ขยายเมื่อมีผลต่อเนื่องและปลายทางพร้อม
ขยายและใช้ซ้ำ	ใช้การเชื่อมข้อมูล นิยาม คิวงาน ชุดทดสอบและความรู้เดิมโดยปรับบริบท	ไม่คัดลอกกฎเครดิตของบริษัทหนึ่งใช้กับทุกบริษัทโดยไม่ตรวจ

เงื่อนไขเดินต่อ ปรับ และหยุด

เดินต่อเมื่อคุณค่าและการใช้จริงดีกว่าฐานเปรียบเทียบโดยต้นทุน/ความเสี่ยงรับได้; ปรับเมื่อพบคอขวดที่แก้ได้ เช่น เอกสารหรือวิธีทำงาน; พักเมื่อรอสิทธิ์/ข้อมูล/เจ้าภาพ; หยุดเมื่อเพิ่มงานสุทธิ ไม่เหนือกว่าทางเลือกง่าย หรือมีความเสี่ยงที่รับไม่ได้

ตัวเลขเกณฑ์ผ่านให้ตกลงก่อนทดลองกับ Business Owner, Finance และผู้ดูแลความเสี่ยง ยังไม่กำหนดเป้าลด DSO/หนี้เสียหรือผลตอบแทนเป็นตัวเลขในชุดนี้

19 | Accelerator Playbook: แผนประมาณ 12 สัปดาห์

ชื่อ “90-Day Accelerator” ใช้สื่อรูปแบบโดยประมาณ ระยะจริงตามผู้ใช้คือเกือบ 3 เดือน Earth ต้องผูกกับวันเริ่มและวัน Challenge ที่ยืนยันแล้ว ไม่ถือว่าได้รับเวลาเพิ่มเป็น 90 วันเต็ม

ช่วงที่เสนอ	งานหลัก / ผู้ทำ	หลักฐานออกจากช่วง
สัปดาห์ 1–2 เปิดโครงการ + วินิจฉัย	COO เปิดกรอบ; Earth รวบรวมเกณฑ์เดิมและสิทธิ์; Mentor กับทีมแยกช่องว่าง	ทะเบียน 17 ทีม, โจทย์หนึ่งหน้า, ค่าฐาน, Mentor, ด่านเป้าหมาย
สัปดาห์ 3–4 ปรับโจทย์ + ต้นแบบ	ทีมทำต้นแบบ; Mentor ช่วยทดลองสมมติฐานสำคัญ; IT/Risk ช่วยตามความเสี่ยง	ผลทดสอบแรก, เทียบวิธีไม่ใช้ AI, รายการสิ่งที่ยังไม่รู้
สัปดาห์ 5–6 กลางทาง	COO ทบทวนตามประเด็นสำคัญ; คณะตัดสินไปต่อ/ปรับ/พัก; Earth บันทึก	ขอบเขตทดลองจริงที่อนุมัติ หรือแผนแก้ช่องว่างพร้อมเจ้าภาพ
สัปดาห์ 7–9 ทดลองจริง	ทีมและผู้ใช้ทำงานในขอบเขต; เก็บผล/ข้อผิดพลาด; Mentor ช่วยอ่านหลักฐาน	ผลทดลอง, เสียงผู้ใช้, ต้นทุน, การสอนกลับและทักษะที่เพิ่ม
สัปดาห์ 10–11 ตรวจหลักฐาน	Earth ตรวจความครบ; Mentor ตรวจเหตุผล; Finance/IT/Risk ตรวจตามหน้าที่	Evidence Pack ฉบับพร้อมอ่าน, ข้อจำกัด, คำขอทรัพยากรขั้นถัดไป
สัปดาห์ 12 หรือก่อนวันจริง Final Challenge	COO + คณะพิจารณาหลักฐาน; ระบุการรับเพิ่มและเส้นทางตามความพร้อม	บันทึกผลตัดสิน, ด่านถัดไป, ผู้รับผิดชอบ, ทรัพยากร, วันทบทวน

7 ทีมเดินต่อในเส้นทางเดิม • **17** ทีมพัฒนาเพื่อขอเพิ่มเข้า
ทีมไม่พร้อมไม่ต้องฝืนขึ้นระบบจริง และไม่ใช้ความเร็วของรอบแข่งขันแทนความปลอดภัย

20 | จังหวะโค้ชที่ไม่ทำให้ COO เป็นคอขวด

ระดับ	รูปแบบที่เสนอ	ผู้รับผิดชอบ
รายสัปดาห์	ทีมอัปเดตหนึ่งหน้า: พบอะไร พิสูจน์อะไร จะทำอะไร และติดอะไร; ไม่ทำสไลด์ใหม่ทุกสัปดาห์	Team Lead ส่ง; Earth รวมภาพและติดตาม
ตามรอบ Mentor	แต่ละทีมมี Mentor หลัก ทบทวนทุก 1–2 สัปดาห์ตามความเสี่ยง; เน้นจุดที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ	Mentor + ทีม
คลินิกผู้เชี่ยวชาญ	รวมโจทย์ที่ติดเหมือนกัน เช่น ข้อมูล การทดสอบ หรือสิทธิ์ เป็นรอบสั้นตามคิว	Earth นัด; Specialist ช่วยเฉพาะปัญหา
COO 3 จุดสำคัญ	เปิดโครงการ / ทบทวนกลางทาง / รอบสุดท้าย; อ่านหลักฐานล่วงหน้าและเน้นการตัดสินใจ	COO + คณะตามอำนาจ
ความเสี่ยงเร่งด่วน	ระงับส่วนที่เสี่ยงและแจ้งเจ้าของงาน/IT/Risk ทันที ไม่รอรอบสัปดาห์	ผู้พบเหตุ + ผู้รับผิดชอบตามหน้าที่

ข้อเสนอการจัดเวลารอบสุดท้าย

หากให้ 17 ทีมทีมละ 12 นาที รวมการถามตอบ จะใช้ 204 นาทีเฉพาะเวลาทีม ยังไม่รวมพักและการตัดสินใจ จึงเสนอแบ่งรอบหรือสองช่วงครึ่งวัน แทนการวางให้จบในประชุมสั้น โดยให้ผู้พิจารณาอ่านหลักฐานล่วงหน้า

ดูแลกำลังคน Mentor และ IT

Earth เก็บเวลาที่ตกลงให้แต่ละทีมและคิวผู้เชี่ยวชาญ ไม่สมมติว่าทุกคนมีเวลาว่างเท่ากัน หากการช่วยเหลือเกินกำลัง ให้คณะลดขอบเขต ปรับจังหวะ หรือจัดลำดับทดลอง ไม่โยนภาระทั้งหมดให้ Earth

เริ่มจากเครื่องมือที่มีและได้รับอนุญาต เมื่อหลักฐานรองรับจึงเพิ่มงบ API/SaaS หรือ Shared Technical Support (ทีมเทคนิคส่วนกลาง) ภายใต้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

21 | Earth: งานประสาน วิเคราะห์ และติดตามที่ใช้จริง

สิ่งที่ **Earth** ดูแล	วิธีทำ	ผลที่ส่งต่อ
ข้อมูลต้นทาง	ขอเกณฑ์เดิม คะแนน คอมเมนต์ และสิทธิ์การเผยแพร่; ตรวจชื่อทีมและเวอร์ชัน	ทะเบียนอ้างอิง ไม่แจกข้อมูลเกินสิทธิ์
วินิจฉัยร่วม Mentor	แยกข้อสังเกตกรรมการ หลักฐานทีม และข้อสันนิษฐานของผู้วิเคราะห์	ช่องว่างหลัก 1–3 เรื่องต่อทีม ไม่จัดคะแนนเองโดยไม่มีเกณฑ์
แผนและคิว	ผูก Mentor หลัก ผู้เชี่ยวชาญ งานถัดไป ผู้รับผิดชอบ และวันส่ง	รายการงานเดียวที่ใช้ติดตามร่วมกัน
ความครบของหลักฐาน	ตรวจว่ามีไฟล์/ลิงก์ เวอร์ชัน วันข้อมูล ผู้ยืนยัน และข้อจำกัด	สถานะครบ/ขาด ไม่รับรองว่าผลธุรกิจถูกต้องแทน Finance
รอบพิจารณา	เตรียมชุดอ่านล่วงหน้า แยกเรื่องขอคำแนะนำกับเรื่องขออนุมัติ	บันทึกมติ เหตุผล เงื่อนไข และทรัพยากรที่ตกลง
บทเรียนและใช้ซ้ำ	รวบรวมวิธีทำ นิยาม ข้อยกเว้น ผลทดสอบ และผู้ดูแล	คลังความรู้ที่ไม่รวมข้อมูลลูกค้าหรือความลับเกินจำเป็น

โครงแฟ้มมาตรฐานที่เสนอ

[Team ID]/01_Problem → 02_Data_QC → 03_Prototype_Test → 04_Pilot_Results → 05_Gate_Decisions → 06_Handover_Knowledge

ทุกไฟล์มีเจ้าของ เวอร์ชัน วันที่ข้อมูล และสิทธิ์เข้าถึง ชื่อไฟล์หรือบันทึกกลางต้องช่วยตามกลับไปถึงแหล่งจริง ไม่เก็บข้อมูลอ่อนไหวซ้ำโดยไม่จำเป็น

การเข้าถึงข้อมูลประเมินเป็นงานประสานกับผู้มีสิทธิ์ ไม่ใช่เหตุให้ **Earth** ต้องทำการประเมินใหม่ทั้งหมด

22 | ชุดหลักฐาน และการรับช่วง IT/Data

Evidence Pack ที่ปรับตามด่าน ไม่ทำเอกสารเต็มทุกข้อทุกครั้ง

หลักฐานแกนกลาง	สิ่งที่ผู้พิจารณาต้องเห็น
โจทย์ + ค่าฐาน	ใครเดือดร้อน งานเดิมเป็นอย่างไร นิยามและแหล่งค่าฐาน
การทดลอง + ผล	วิธีเทียบ กลุ่ม/ช่วงเวลา ผลจริง ต้นทุน ข้อจำกัด และสิ่งที่ไม่สำเร็จ
ผู้ใช้ + ความสามารถทีม	เสียงผู้ใช้จริง การทำซ้ำ การตรวจคำตอบ และการสอนกลับ
เดโม + ผลทดสอบ	เส้นทางทำงานจริง พร้อมเคสผิดพลาด ไม่แสดงเฉพาะเคสง่าย
ข้อมูล/เทคนิค/ความเสี่ยง	สิทธิ์ QC ขอบเขต ความเป็นไปได้ และคนรับรองตามหน้าที่
คำขอขั้นถัดไป	ด่านที่ขอผ่าน งบ/เวลาหรือกำลังคน เจ้าภาพ และเงื่อนไขหยุด

ก่อนรับช่วงทำระบบจริง

ทีมธุรกิจส่งโจทย์/กระบวนการ ข้อมูลและสิทธิ์ สูตร/กฎ คำสั่งและเวอร์ชัน AI ชุดทดสอบ ผลทดลอง กรณียกเว้น คู่มือผู้ใช้ ข้อจำกัด และต้นทุน; IT/Data ตรวจการเชื่อมระบบ การดูแลและการทดสอบรับมอบก่อนรับงาน

Business Owner ยังรับผิดชอบผลธุรกิจและการนำไปใช้ IT/Data รับผิดชอบงานเทคนิคที่ตกลงไว้ การรับช่วงเป็นการเปลี่ยนผู้ทำด้านเทคนิค ไม่ใช่ส่งปัญหาทั้งก้อนไปให้ IT

G3 อนุมัติพัฒนาให้พร้อมจริง; G4 จึงพิจารณาเปิดใช้ การได้สิทธิ์ทำระบบไม่ใช่สิทธิ์เปิดให้ผู้ใช้ทั้งหมดทันที

23 | ก้าวถัดไป และ Risk / Blocker

เริ่มด้วยงานเดียวที่ทำให้กรอบตรงของจริง

ให้ **Earth** จัดชุดตั้งต้นสำหรับคุยกับ **COO/Mentor:** เกณฑ์เดิม **+** คอมเมนต์ **+** รายชื่อ/โจทย์ **17** ทีม **+** วันรอบถัดไป **+** ข้อมูลผู้มีอำนาจและสิทธิ์ใช้เครื่องมือ
จากนั้นเลือกทีมตัวอย่างหนึ่งทีมมาทดลองการวินิจฉัยและการโค้ชก่อนใช้ครบทุกทีม

ประเด็นยังไม่ยืนยัน	ผู้ประสาน / สิ่งที่ต้องได้	ผลต่อการตัดสินใจ
เกณฑ์และคอมเมนต์เดิม	Earth รวบรวมฉบับจริงและสิทธิ์เข้าถึง	ใช้เทียบเกณฑ์และวินิจฉัยช่องว่างรายทีม
AI/Data policy และบัญชี	IT/Data/Governance ยืนยันเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ได้	กำหนดข้อมูลต้นแบบและสิทธิ์เชื่อมระบบ
เจ้าภาพและผู้อนุมัติ	COO/หน่วยงานยืนยัน Business Owner คณะและขอบอำนาจ	ไม่ให้ผ่านด่านแต่ไม่มีคน/งบรองรับ
วันและเวลาทำงาน	Earth ยืนยันวันรอบถัดไปและคิว COO/Mentor/IT	ปรับแผนให้ตรงเกือบ 3 เดือนจริง
หลักฐานและผลประโยชน์	ทีม + Finance/ผู้ใช้ตรวจฐานเปรียบเทียบและต้นทุน	ไม่อ้างลดต้นทุนหรือหนี้เสียเกินข้อมูล

เกณฑ์ทบทวนกรอบหลังใช้ครั้งแรก

เดินต่อเมื่อทีมและ Mentor ระบุช่องว่าง/การทดลองถัดไปได้ชัดขึ้น และ Earth ตามหลักฐานได้โดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็น; ปรับเมื่อแบบฟอร์มซ้ำซ้อนหรือเข้าใจด่านต่างกัน; หยุดการทดลองที่มีข้อมูลหรือการกระทำไม่ปลอดภัยก่อน

ยังไม่มีการติดต่อ Earth การส่งอีเมล การนัดประชุม หรือการอนุมัติโครงการจากชุดเอกสารนี้

24 | แหล่งอ้างอิงและการควบคุมเวอร์ชัน

ตรวจแหล่งทางการวันที่ 28 ก.ย. 2569 (2026-09-28) | เลข [Sx] ในภาพและคู่มือเชื่อมกับรายการนี้

[S1] MIT CISR — Building Enterprise AI Maturity

19 Dec 2024; survey 2022 and interviews 2024
https://cisr.mit.edu/publication/2024_1201_EnterpriseAIMaturityModel_WeillWoernerSebastian

[S2] Microsoft Research / HAX — Guidelines for Human-AI Interaction

Research 2019; official HAX guide
https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/ai-guidelines/

[S2a] Microsoft Research — Guidelines for Human-AI Interaction – research overview

4 Jun 2019
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/guidelines-for-human-ai-interaction/

[S3] Stage-Gate International / Robert G. Cooper — The Stage-Gate Model: An Overview

Official web overview; accessed 28 Sep 2026
https://www.stage-gate.com/blog/the-stage-gate-model-an-overview/

[S4] NIST — AI Risk Management Framework 1.0: Core

2023; revision in progress on official site
https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

[S4a] NIST — AI Risk Management Framework

Version/status overview; accessed 28 Sep 2026
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

[S5] ISO — ISO/IEC 42001:2023 – AI management systems

Edition 1, Dec 2023; public overview only
https://www.iso.org/standard/42001

[S6] OECD.AI — AI Principles overview

Adopted 2019; updated May 2024
https://oecd.ai/en/ai-principles

[S7] OpenAI — Enterprise privacy at OpenAI

Official product privacy page; accessed 28 Sep 2026
https://openai.com/enterprise-privacy/

ข้อมูลบริบทภายใน: บทสนทนากับผู้ใช้ในโครงการนี้ ไม่ใช่รายงานประชุมหรือหลักฐานประเมินที่ตรวจแล้ว | ตัวอย่างโครงสร้าง PCC กฎด่าน แผนเวลา และแบบฟอร์มเป็นข้อเสนอที่จัดทำเพื่อโจทย์นี้

เครื่องหมาย Stage-Gate® เป็นของเจ้าของสิทธิ์ตามต้นฉบับ การอ้างอิงไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนหรือรับรองชุดนี้

25 | อภิธานศัพท์ที่ใช้สอนทีม

คำ	ความหมายที่ใช้ในชุดนี้
AI Transformation	เปลี่ยนวิธีทำงานและความสามารถองค์กรด้วย AI ไม่ใช่เพียงซื้อเครื่องมือ
Operating Model	วิธีจัดคน งาน การตัดสินใจ และความรับผิดชอบให้ทำงานร่วมกัน
Use Case / Domain	กรณีใช้งานหนึ่งเรื่อง / กลุ่มงานที่มีบริบทคล้ายกัน
Prototype / Pilot / Production	ต้นแบบทดลอง / ลองใช้ในงานจริงขอบเขตเล็ก / ระบบที่พร้อมดูแลและใช้จริง
Stage / Gate	ช่วงที่ทำงานและเรียนรู้ / จุดตัดสินใจว่าจะอนุมัติทำขั้นถัดไปหรือไม่
Baseline / Evidence Pack	ค่าฐานก่อนเปลี่ยน / ชุดหลักฐานประกอบการตัดสินใจ
Output / Outcome / Impact	สิ่งที่ทำสำเร็จ / การเปลี่ยนในงานหรือพฤติกรรม / ผลปลายทางธุรกิจหรือผู้เกี่ยวข้อง
Capability / Adoption / Scale	ความสามารถทำงานต่อเอง / ใช้จริงต่อเนื่อง / ขยายผลไปงานหรือหน่วยงานอื่น
Human-in-the-loop	ให้คนตรวจหรืออนุมัติในจุดที่กำหนดของงาน AI
PMO / Mentor / Specialist	ผู้ประสานและติดตามโครงการ / ผู้ช่วยโค้ช / ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
Re-entry / Final Challenge	การกลับมาขอไปต่อ / รอบนำหลักฐานมาทบทวนและตัดสินเส้นทาง
QC / Governance / Rollback	ตรวจคุณภาพ / กำกับบทบาทและกติกา / ย้อนกลับไปสู่สภาพที่ปลอดภัย
API / SaaS	ช่องทางให้ระบบเชื่อมกัน / ซอฟต์แวร์บริการที่ใช้งานผ่านผู้ให้บริการ
PDPA / DSO	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตรวจการใช้จริงกับผู้รับผิดชอบ) / จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยตามนิยามที่ตกลง
